

ACUSE

12 de Octubre de 2023.

OFICIO No. P.M./0213/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. RENE RAMÍREZ COYOTL



PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE230302249193 | 159143 | MTH-FISM/2023-001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CALLEJON DE LA PRIVADA 2 NORTE ENTRE PRIVADA 2 NORTE Y LINDERO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | \$ 251,505.47 | 100 | 100 | 168.18 M2 | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302247173 | 147204 | MTH-FISM/2023-002 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 1RA. CERRADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE. | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | \$ 203,262.12 | 100 | 100 | 55.00 MTS | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302250375 | 165873 | MTH-FISM/2023-003 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE 8 NORTE Y LINDERO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | \$ 508,021.41 | 100 | 100 | 385.45 M2 | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302253117 | 179823 | MTH-FAISMUN/2023-004 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 21 PONIENTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 3 SUR Y CALLE SIN NOMBRE | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | \$ 465,058.08 | 100 | 100 | 180.00 MTS | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302253172 | 180102 | MTH-FAISMUN/2023-005 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA 4 PONIENTE ENTRE 4 PONIENTE Y LINDERO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 694,106.73 | \$ 694,106.73 | \$ 694,106.73 | \$ 694,106.73 | \$ 208,232.02 | \$ 208,232.02 | \$ 208,232.02 | 75 | 30 | 450.00 M2 | OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 75% FISICAMENTE Y 30% FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302254305 | 187254 | MTH-FAISMUN/2023-006 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA 1RA PRIVADA DE LOS ALAMOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 5 ORIENTE | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 390,711.75 | \$ 390,711.75 | \$ 390,711.75 | \$ 390,711.75 | \$ 117,213.52 | \$ 117,213.52 | \$ 117,213.52 | 100 | 30 | 200.00 MTS | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y 30% FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302263589 | 242048 | MTH-FAISMUN/2023-007 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y 10 SUR | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 2,124,376.93 | \$ 2,124,376.93 | \$ 2,124,376.93 | \$ 2,124,376.93 | \$ 637,313.08 | \$ 637,313.08 | \$ 637,313.08 | 30 | 30 | 559.00 M2 | OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 30% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302257309 | 208069 | MTH-FAISMUN/2023-008 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 8 SUR | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 450,562.44 | \$ 450,562.44 | \$ 450,562.44 | \$ 450,562.44 | \$ - | \$ - | \$ - | 30 | 0 | 386.60 MTS | OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 30% FISICAMENTE Y 0% FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302258405 | 213921 | MTH-FAISMUN/2023-009 | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1251V | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 1,146,792.52 | \$ 1,146,792.52 | \$ 1,146,792.52 | \$ 1,146,792.52 | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | 0 | | OBRA AUN NO INICIA A EJECUTARSE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPATLAXCO DE HIDALGO
 PUEBLA
 2021-2024




MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|---|---|---|--|
| PUE230302263461 | 241525 | MTH-FAISMUN/2023-010 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 21DPR3525H EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO. | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 1,263,313.27 | \$ 1,263,313.27 | \$ 1,263,313.27 | \$ 1,263,313.27 | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | OBRA AUN NO INICIA A EJECUTARSE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302258104 | 212334 | MTH-FAISMUN/2023-011 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE 4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC ACAJETE. | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 685,387.23 | \$ 685,387.23 | \$ 685,387.23 | \$ 685,387.23 | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | OBRA AUN NO INICIA A EJECUTARSE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302259277 | 219578 | MTH-FAISMUN/2023-012 | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUE. | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 1,298,082.85 | \$ 1,298,082.85 | \$ 1,298,082.85 | \$ 1,298,082.85 | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | OBRA AUN NO INICIA A EJECUTARSE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| PUE230302263512 | 241693 | MTH-FAISMUN/2023-013 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO CALMECAC CON CLAVE: 21EBH0784Q. | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 2,094,884.03 | \$ 2,094,884.03 | \$ 2,094,884.03 | \$ 2,094,884.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | OBRA AUN NO INICIA A EJECUTARSE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |

FORTAMUN-DF

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|---------------------|-----------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE230202232279 | NO APLICA | MTH-FORT/2023-005 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA DE LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LINDERO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 1,071,993.10 | \$ 1,198,715.81 | \$ 1,198,715.81 | \$ 1,198,715.81 | \$ 1,198,715.81 | \$ 1,198,715.81 | \$ 1,198,715.81 | 100 | 100 | 758.73 M2 | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| TMP_PUE230302270064 | NO APLICA | MTH-FORT/2023-006 | CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF) | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | \$ 516,250.41 | 100 | 100 | 270.25 M2 | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| TMP_PUE230302270119 | NO APLICA | MTH-FORT/2023-009 | ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION 9 ORIENTE ENTRE CALLES 10 SUR Y 12 SUR | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 1,598,016.53 | \$ 1,598,016.53 | \$ 1,598,016.53 | \$ 1,598,016.53 | \$ 479,404.96 | \$ 479,404.96 | \$ 479,404.96 | 100 | 30 | 1440.00 M2 | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y 30% FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| TMP_PUE230302270143 | NO APLICA | MTH-FORT/2023-007 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS) 2DA ETAPA | TEPATLAXCO DE HIDALGO | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | \$ 498,115.11 | 100 | 100 | 300.00 PZA | OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2023) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPATLAXCO DE HIDALGO
 PUEBLA
 2021-2024



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 3ER TRIMESTRE DE 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 2do. Trimestre | 0.00 | 0 | 5 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 3er. Trimestre | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 13 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS. |
| | 4to. Trimestre | 0.00 | 0 | 15 | | | | |

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 2do. Trimestre | 40.00 | 2 | 5 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 3er. Trimestre | 44.44 | 4 | 9 | 61.54 | 8 | 13 | EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 8 PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA. |
| | 4to. Trimestre | 46.67 | 7 | 15 | | | | |

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 2do. Trimestre | 60.00 | 3 | 5 | | 0 | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE REGISTRO EN EL SRFT. |
| | 3er. Trimestre | 55.56 | 5 | 9 | 38.46 | 5 | 13 | EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 5 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. |
| | 4to. Trimestre | 53.33 | 8 | 15 | | | | |

PRESIDENTE
 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
 DE HIDALGO,
 PUEBLA
 2021-2024



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 3ER TRIMESTRE DE 2023

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | 1er. Trimestre | 16.67 | 2,789,581.16 | 16,737,487.00 | 16.67 | 2,789,581.16 | 16,737,487.00 | LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 6,973,952.90 | 16,737,487.00 | 41.67 | 6,973,952.90 | 16,737,487.00 | LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO. |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 11,158,324.64 | 16,737,487.00 | 66.67 | 11,158,324.64 | 16,737,487.00 | LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE LOS MESES DE ENERO - AGOSTO. |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 16,737,487.00 | 16,737,487.00 | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | 4to. Trimestre | 100.00 | 16,737,487.00 | 16,737,487.00 | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | 1er. Trimestre | 1.28 | 213,796.00 | 16,737,487.00 | 1.28 | 213,796.00 | 16,737,487.00 | GASTO EJERCIDO DE ENERO A MARZO |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 6,973,952.90 | 16,737,487.00 | 17.71 | 2,965,023.93 | 16,737,487.00 | GASTO EJERCIDO DE ENERO A JUNIO |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 11,158,324.64 | 16,737,487.00 | 44.42 | 7,434,713.89 | 16,737,487.00 | GASTO EJERCIDO DE ENERO - AGOSTO |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 16,737,487.00 | 16,737,487.00 | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 2do. Trimestre | 4.55 | 6,973,952.90 | 1,533,606.90 | 3.17 | 6,973,952.90 | 2,199,494.79 | RECURSOS MINISTRADOS DE ENERO A JUNIO ENTRE LOS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS DE ENERO A JUNIO |
| | 4to. Trimestre | 5.46 | 16,737,487.00 | 3,067,213.79 | | | | |
| Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100 | 4to Trimestre | 6.86 | 41,046,017.69 | 38,410,465.69 | -100.00 | | | |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,
 PUEBLA
 2021-2024


TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, TERCER TRIMESTRE 2023

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Ramo | Modalidad | Pograma presupuestario | Programa Fondo Convenio - Especifico | Institucion Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Observaciones | |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|---------|----------|------------|------------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|
| 21 | 163 | 1 | 2023 | 2 | 33 | I | | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 12068.08 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 612 | 2142337 | 6000000 | 5945869.6 | 5803072.67 | 0 | 0 | 0 | | | | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL, CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL Y GRADAS |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 613 | 5690000 | 2194981.62 | 2194981.62 | 2194981.62 | 785533.72 | 785534 | 785533.72 | | | | OBRAS REFERENTES A ELECTRIFICACIONES |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | 8100000 | 7737355.38 | 4605018.4 | 3578010.54 | 1605071.98 | 1605072 | 1605072 | | | | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO |
| 21 | 163 | 1 | 2023 | 2 | 33 | I | | 5 FORTAMUN | 1 | 10702.99 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 113 | 1400000 | 900000 | 880000 | 520641 | 520641 | 520641 | 520641 | | | | PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 271 | 250000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 311 | 3080000 | 3595000 | 2900000 | 2443591 | 2443591 | 2443591 | 2443591 | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO) |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 441 | 1000000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | | | | ASIGNACION DE FERTILIZANTE DESTINADO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 523 | 600000 | 600000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ADQUISICION DE CAMARAS DE SOLAPA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 541 | 2000000 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 853 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 1202995.6 | 1202995.6 | 1202996 | 1202995.6 | | | | PAGO A CONVENIO DE CERESO Y RELLENO SANITARIO |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 612 | 3000000 | 2451236.59 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 613 | 1500000 | 1500000 | 570000 | 498115.11 | 498115.11 | 498115 | 498115.11 | | | | OBRAS REFERENTES A ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | 1607487 | 3500000 | 3067074.23 | 2796732.34 | 1678120.77 | 1678121 | 1678120.8 | | | | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 622 | 800000 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250 | 516250.41 | | | | OBRA REFERENTE A REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO |


 MUNICIPAL
 TEPATLAXCO
 DE HIDALGO,
 PUEBLA
 2021-2024



| Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|----------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|--|----------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--|
| Tepatlxco de Hidalgo | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Sin Especificar | Sin Especificar | 12068.08 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 15932337 | 15932337 | 12745869.62 | 11576064.83 | 2390605.7 | 2390605.7 | 2390605.7 | | |
| Tepatlxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 2142337 | 6000000 | 5945869.6 | 5803072.67 | 0 | 0 | 0 | Validado | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELAS, CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL, CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL Y GRADAS |
| Tepatlxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 5690000 | 2194981.62 | 2194981.62 | 2194981.62 | 785533.72 | 785533.72 | 785533.72 | Validado | OBRAS REFERENTES A ELECTRIFICACIONES |
| Tepatlxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 8100000 | 7737355.38 | 4605018.4 | 3578010.54 | 1605071.98 | 1605071.98 | 1605071.98 | Validado | OBRAS REFERENTES A CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO |

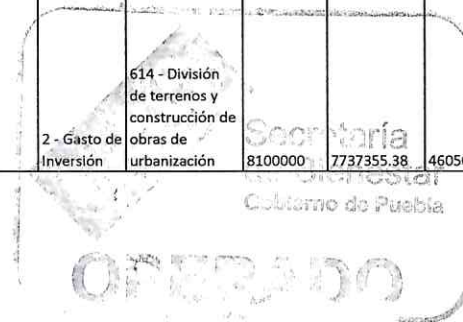


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,
 PUEBLA
 2021-2024

EJERCICIO DEL GASTO DE TERCER TRIMESTRE 2023

| Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura) | |
|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|----------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Tepatlatxco de Hidalgo | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 10702.99 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 16737487 | 16737487 | 11158324.64 | 8553325.46 | 7434713.89 | 7434713.89 | 7434713.89 | | | |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 1400000 | 900000 | 880000 | 520641 | 520641 | 520641 | 520641 | Validado | PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 1202995.6 | 1202995.6 | 1202995.6 | 1202995.6 | Validado | PAGO A CONVENIO DE CERESO Y RELLENO SANITARIO | |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 523 - Cámaras fotográficas y de video | 600000 | 600000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICION DE CAMARAS DE SOLAPA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 2000000 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO | |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 1000000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | Validado | ASIGNACION DE FERTILIZANTE DESTINADO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 622 - Edificación no habitacional | 800000 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | Validado | OBRA REFERENTE A REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 3000000 | 2451236.59 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | OBRAS REFERENTES A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | 1500000 | 1500000 | 570000 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | Validado | OBRAS REFERENTES A ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE |
| Tepatlatxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1607487 | 3500000 | 3067074.23 | 2796732.34 | 1678120.77 | 1678120.77 | 1678120.77 | 1678120.77 | Validado | OBRAS REFERENTES A CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN |

PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA
2021-2024

EJERCICIO DEL GASTO DE TERCER TRIMESTRE 2023

| Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|----------------------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------|----------|--|
| Tepatlxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes | 250000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |
| Tepatlxco de Hidalgo | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | | | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 3080000 | 3595000 | 2900000 | 2443591 | 2443591 | 2443591 | 2443591 | Validado | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO) |



PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLXCO DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCERO | | | | | AVANCES_FISICOS | | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
|------------------|------|-----------------|-----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--------------|------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| CICLO | TRIM | FOLIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | METAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENIGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
| 2023 | 3 | PUE230302253172 | 694106.73 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694106.73, modificado:694106.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA 4 PONIENTE ENTRE 4 PONIENTE Y LINDERO - 180102 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 180102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 09-08-2023 | 22-09-2023 | 694106.73 | 694106.73 | 208232.02 | 208232.02 | 208232.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302257309 | 450562.44 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450562.44, modificado:450562.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 8 SUR - 208069 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 208069 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 05-09-2023 | 04-10-2023 | 450562.44 | 450562.44 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:156.6}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302258104 | 685387.23 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685387.23, modificado:685387.23}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE 4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC ACAJETE. - 212334 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 212334 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 28-08-2023 | 26-09-2023 | 685387.23 | 685387.23 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302254305 | 390711.75 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390711.75, modificado:390711.75}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA 1RA PRIVADA DE LOS ALAMOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 5 ORIENTE - 187254 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 187254 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 25-08-2023 | 18-09-2023 | 390711.75 | 390711.75 | 117213.52 | 117213.52 | 117213.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302258405 | 1146792.52 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146792.52, modificado:1146792.52}} | REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1251V - 213921 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 213921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.46, meta_modificada:466.46}} | 01-09-2023 | 15-11-2023 | 1146792.52 | 1146792.52 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302263461 | 1263313.27 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263313.27, modificado:1263313.27}} | CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 21DPR3525H EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO. - 241525 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 241525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 07-09-2023 | 05-12-2023 | 1263313.27 | 1263313.27 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302263512 | 2094884.03 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094884.03, modificado:2094884.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO CALMECAC CON CLAVE 21EBH0784Q - 241693 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 241693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.4, meta_modificada:659.4}} | 11-09-2023 | 09-12-2023 | 2094884.03 | 2094884.03 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302259277 | 1298082.85 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298082.85, modificado:1298082.85}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUE. - 219578 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 219578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.78, meta_modificada:590.78}} | 11-09-2023 | 09-11-2023 | 1298082.85 | 1298082.85 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302263589 | 2124376.93 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124376.93, modificado:2124376.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y 10 SUR - 242048 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 242048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.2, meta_modificada:1864.2}} | 14-09-2023 | 12-12-2023 | 2124376.93 | 2124376.93 | 637313.08 | 637313.08 | 637313.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302249193 | 251505.47 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251505.47, modificado:251505.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CALLEJON DE LA PRIVADA 2 NORTE ENTRE PRIVADA 2 NORTE Y LINDERO - 159143 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 159143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.5, meta_modificada:166.18}} | 10-07-2023 | 28-08-2023 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.18}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302253117 | 465058.08 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465058.08, modificado:465058.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 21 PONIENTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 3 SUR Y CALLE SIN NOMBRE - 179823 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 179823 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 09-08-2023 | 28-08-2023 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302247173 | 203262.12 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203262.12, modificado:203262.12}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 1RA. CERRADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE. - 147204 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 147204 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 26-06-2023 | 30-07-2023 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}} | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302250375 | 508021.41 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508021.41, modificado:508021.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE 8 NORTE Y LINDERO - 165873 | Tepatlatxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo | 165873 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.45, meta_modificada:385.45}} | 27-07-2023 | 14-09-2023 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.45}} | Validado avances | Sin observaciones |



 PRESIDENTE

 HONORABLE

 SECRETARÍA DE


 FINANZAS Y ECONOMÍA

 DEPARTAMENTO


 DE FISCALÍA

 2023-12-12

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCERO | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------------|-----------------------|---|--|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------|------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|
| CICLO | TRIM | FOUO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | METAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
| 2023 | 3 | PUE230302270119 | 1598016.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598016.53, modificado:1598016.53}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION 9 ORIENTE ENTRE CALLES 10 SUR Y 12 SUR | Tepatlxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-009 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 26-07-2023 | 23-09-2023 | 1598016.53 | 1598016.53 | 479404.96 | 479404.96 | 479404.96 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302270064 | 516250.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516250.41, modificado:516250.41}} | CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF) | Tepatlxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-006 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.25, meta_modificada:270.25}} | 14-06-2023 | 28-07-2023 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:270.25}} | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230302270143 | 498115.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498115.11, modificado:498115.11}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS) 2DA ETAPA | Tepatlxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-007 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 26-06-2023 | 25-07-2023 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:300.0}} | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | PUE230202232279 | 1071993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071993.1, modificado:1198715.81}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA DE LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LINDERO | Tepatlxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepatlxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.34, meta_modificada:758.73}} | 14-06-2023 | 12-08-2023 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.8 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:758.73}} | Validado avances | Sin observaciones |




PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLXCO DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024




| Ciclo | Trim | Municipio | Ramo | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-------|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-------------------------|---------------|---|------------|----------|
| 2023 | 3 | Tepatlatxco de Hidalgo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 178220 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2023, NO SE TENDRÁN CONTEMPLADOS PROYECTOS EN ESTE RUBRO, PUESTO QUE SE ENFOCARAN A LOS PROYECTOS EN LOS RUBROS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA. | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2023, NO SE TENDRÁN CONTEMPLADOS PROYECTOS EN ESTE RUBRO, PUESTO QUE SE ENFOCARAN A LOS PROYECTOS EN LOS RUBROS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA. | 0 | Otras causas | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS, EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS. | 100 | Validado |
| 2023 | 3 | Tepatlatxco de Hidalgo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181467 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 44.44444 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA PARA EL EJERCICIO 2023, SI SE REALIZARA LA PLANEACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SE PRETENDE LLEGAR A UN TOTAL DE 15 ACCIONES DEL EJERCICIO 2023 Y SERÁN EJECUTADAS GRADUALMENTE CONFORME AVANZA EL AÑO Y ASÍ COMO SU REGISTRO EN LA MIDS LOS CUALES MIGRARAN AL SISTEMA SRFT. | 44.44444 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA PARA EL EJERCICIO 2023, SI SE REALIZARA LA PLANEACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SE PRETENDE LLEGAR A UN TOTAL DE 15 ACCIONES DEL EJERCICIO 2023 Y SERÁN EJECUTADAS GRADUALMENTE CONFORME AVANZA EL AÑO Y ASÍ COMO SU REGISTRO EN LA MIDS LOS CUALES MIGRARAN AL SISTEMA SRFT. | 61.53846 | Otras causas | EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 8 PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA. | 138.46 | Validado |
| 2023 | 3 | Tepatlatxco de Hidalgo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182653 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 55.55556 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL EJERCICIO 2023, SI SE REALIZARA LA PLANEACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SE PRETENDE LLEGAR A UN TOTAL DE 15 ACCIONES DEL EJERCICIO 2023 Y SERÁN EJECUTADAS GRADUALMENTE CONFORME AVANZA EL AÑO Y ASÍ COMO SU REGISTRO EN LA MIDS LOS CUALES MIGRARAN AL SISTEMA SRFT. | 55.55556 | {just1:{ciclo:2023,trim:3;Just:Otras causas,usuario:jorg edoloresr,fecha:12/10/23}} | EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL EJERCICIO 2023, SI SE REALIZARA LA PLANEACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SE PRETENDE LLEGAR A UN TOTAL DE 15 ACCIONES DEL EJERCICIO 2023 Y SERÁN EJECUTADAS GRADUALMENTE CONFORME AVANZA EL AÑO Y ASÍ COMO SU REGISTRO EN LA MIDS LOS CUALES MIGRARAN AL SISTEMA SRFT. | 38.46154 | Otras causas | EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 5 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | 144.44 | Validado |



PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLATXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024

| Ciclo | Trim | Municipio | Ramo | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-------|------|-----------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|-----------------|--|---------|-----------------|--|---------|-------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| 2023 | 3 | Tepatlxaco de Hidalgo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005 | FORTAMUN | 181721 | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 66.66666 | {just1:{ciclo:2023,trim:3,just:Otras causas,usuario:jorgedoloresr,fecha:12/10/23}} | | 66.66666 | {just1:{ciclo:2023,trim:3,just:Otras causas,usuario:jorgedoloresr,fecha:12/10/23}} | | 44.41953 | Otras causas | | 66.63 | Validado |
| 2023 | 3 | Tepatlxaco de Hidalgo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005 | FORTAMUN | 182549 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 66.66666 | {just1:{ciclo:2023,trim:3,just:Otras causas,usuario:jorgedoloresr,fecha:12/10/23}} | | 66.66666 | {just1:{ciclo:2023,trim:3,just:Otras causas,usuario:jorgedoloresr,fecha:12/10/23}} | | 66.66666 | Otras causas | | 100 | Validado |




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,
 PUEBLA
 2021-2024
